

# Die Dienstekonsolidierung auf einen BLICK

Berichtszeitraum: September/  
Oktober 2024



Ansprechpartner: DG II 4

## Wichtiges in Kürze zum Berichtszeitraums

1. Zielerreichung bis 2025: 15 Maßnahmen sind abgeschlossen, weitere 7 stehen in einer mind. ersten Version zur Verfügung, 11 Maßnahmen grün, 7 Maßnahmen gelb und 4 rot,
2. Im Berichtszeitraum wurden 4% Rollouts abgeschlossen.
3. Derzeit findet eine Priorisierung der DK-Maßnahmen im Ressortkreis statt.
4. Bundescloud 2.0 wird vom BMF weitergeführt.
5. PVSplus wurde in 2 Behörden produktiv gesetzt.
6. Das SAM-Tool ist im BMI im Wirkbetrieb.
7. GSB 11 ist in 2 Behörden Live gegangen.

## Zielerreichung bis 2025

### Statusmeldung der Maßnahmen




## Rolloutübersicht der DK

Maßnahmen stehen zur Verfügung	7	—	Maßnahmen in Evaluation	1	—
Maßnahme beendet	15	—	Ruhende Maßnahmen	2	↘
Rollout begonnen	13	—	Maßnahmen ohne Rollout (in DK)	2	↗

Legende: ↗ = Steigerung zum Vorbericht    — = gleichbleibend    ↘ = Verringerung zum Vorbericht

# Rollout-Status des Programms Dienstekonsolidierung – Stand 31. Oktober 2024

DK-Maßnahmen	Rollout/Bereitstellung										
	Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
mit Rollout-zeiträumen	Bundesclient	[Bar chart showing rollout from 2019 to 2026]									
	Bundescloud	[Bar chart showing rollout from 2019 to 2022]									
	Bedarfserhebungstool	[Bar chart showing rollout from 2019 to 2024]									
	PVS Bund	[Bar chart showing rollout from 2019 to 2026]									
	E-Akte	[Bar chart showing rollout from 2020 to 2024]									
	E-Rechnung	[Bar chart showing rollout from 2020 to 2021]									
	Digitales Zwischenarchiv Bund	[Bar chart showing rollout from 2021 to 2025]									
	Computer Aided Facility Mgmt.	[Bar chart showing rollout from 2023 to 2025]									
	Government-Site-Builder	[Bar chart showing rollout from 2024 to 2025]									
	E-Scannen	[Bar chart showing rollout from 2024 to 2026]									
	SAM-Tool	[Bar chart showing rollout from 2024 to 2026]									
	E-Verkündung	[Bar chart showing rollout from 2025 to 2026]									
	Vergabemanagementsystem	[Bar chart showing rollout from 2026 to 2027]									
	Kaufhaus d. Bundes Next Gen.	[Bar chart showing rollout from 2026 to 2027]									

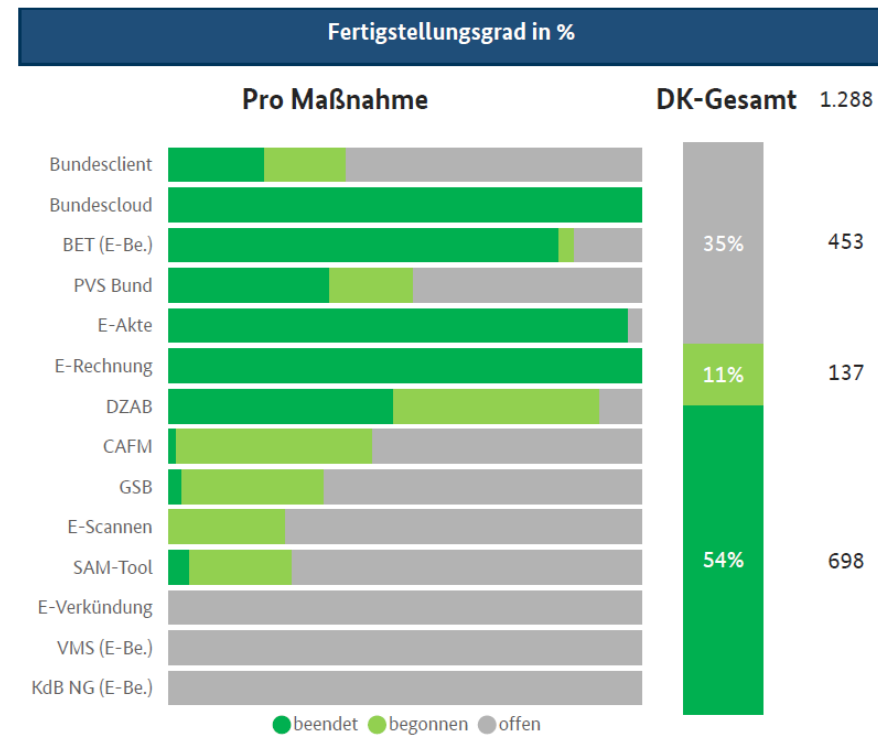

	Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
mit Bereitstellungszeitpunkt	Planungs- und Kabinetttmgmt.	♦								
	Social Intranet des Bundes	♦								
	E-Payment		♦							
	E-Gesetzgebung		♦							
	G2X Kommunikationsdienst			♦						
	IT-Grundschutz-Tool					♦				
	Prozessmanagement-Tool						♦			
	Open Data							♦		
	IT-Rahmenplanung 4 Web								♦	
	WiBe Kalkulator								♦	

Maßnahmen mit anderem Status

**Evaluierungsmaßnahmen**

E-Learning

**Ohne Rollout in der DK**

Dezentrale Haushalts-IT, IAM

**ruhend**

Controlling Bund, meDA

**beendete und in Verfahren überführte Maßnahmen**

BundTV, Audiokonferenzanlage, Bundescloud, Chatbot, eNorm, E-Rechnung, E-Beihilfe, FMS\*, Fördermanagement\*, Nutzerkonto, Geodaten, Mobile Apps, service.bund.de, TMS\*, Verwaltungsportal

\*Umsetzung in Nachfragemanagementorganisation
